
 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare UNIVERSIDAD Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	



**INFORME SEMESTRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DEPARTAMENTAL DE CASANARE
INFORME No. XVI
2º. Semestre de 2023
(Del 01 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023)**

GOBERNADOR

CESAR AUGUSTO ORTIZ ZORRO
Gobernador Departamento de Casanare

PLANEACION

ALFONSO CARSDENAS ORTIZ
Director Departamento Administrativo de Planeación

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

INFORME No. 16 DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEPARTAMENTAL DE CASANARE

Periodo comprendido entre el 01/07/2023 al 31/12/2023

I. INTRODUCCIÓN

Con base en lo establecido en el artículo 70 de la Ley 2056 de 2020 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías”, corresponde al departamento de Casanare como entidad beneficiaria de recursos del Sistema General de Regalías – SGR realizar de forma ordinaria a través de su página web, carteleras y demás espacios de información a la ciudadanía, semestralmente realizar la rendición de cuentas sobre los resultados de la ejecución del capítulo del correspondiente plan de desarrollo territorial, el cual se denominará "inversiones con cargo al SGR" y sus modificaciones o adiciones, así como los monitoreos, auditorías o las evaluaciones que sobre la entidad territorial realicen las entidades nacionales competentes.



II. RENDICIÓN DE CUENTAS

A. REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLE DE PLANEACION



No.	Nombre	Entidad	Periodo	Cargo
1.	Cesar Augusto Ortiz Zorro	Gobernación de Casanare	01/07/2023 – 31/12/2023	Gobernador
2.	Alfonso Cárdenas Silva	Gobernación de Casanare	01/07/2023 – 31/12/2023	Director Departamento Administrativo de Planeación

B. PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD DURANTE EL PERIODO RENDIDO

CONCEPTO	DESCRIPCION	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS	SUBTOTAL
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	Disponibilidad inicial en plataforma SPGR y Reducciones	\$ 41.552.784.756,45	\$ 0,00	\$ 41.552.784.756,45
ASIGNACION DE INVERSION REGIONAL 60%	Disponibilidad inicial en plataforma SPGR	\$ 0,00	\$ 5.993.371.347,92	\$ 5.993.371.347,92
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) GOBERNACION DE CASANARE - CORRIENTES 2023-2024	Ley 2279 de 2022 (Anexo 1, Página 39)	\$ 637.661.024.842,00	\$ 0,00	\$ 637.661.024.842,00
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) DEPARTAMENTO DE CASANARE	Decreto 124 de 2023 Rendimientos Financieros AD20% (Anexo 1 Página 25)	\$ 17.148.936.744,00	\$ 0,00	\$ 17.148.936.744,00

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casánare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

REINTEGROS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	Decreto 363 del 16 de marzo de 2023 (Anexo 3 Página 29)	\$ 11.420.392.831,00	\$ 0,00	\$ 11.420.392.831,00
MULTAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	Decreto 363 del 16 de marzo de 2023 (Anexo 3 Página 29)	\$ 21.941.125,00	\$ 0,00	\$ 21.941.125,00
MAYOR RECAUDO	Decreto 443 del 29 de marzo de 2023 (Anexo 1 Página 16)	\$ 229.907.260.721,00	\$ 0,00	\$ 229.907.260.721,00
ASIGNACIONES DIRECTAS VIGENCIAS ANTERIORES	Decreto 1065 del 29 de junio de 2023 (Página 8)	\$ 781.708,50	\$ 0,00	\$ 781.708,50
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2 ENTIDADES BENEFICIARIAS DE ASIGNACIONES DIRECTAS	Decreto 1279 del 31 de julio de 2023 (Página 16)	\$ 24.513.716.736,77	\$ 0,00	\$ 24.513.716.736,77
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS CORRIENTES 2023-2024	Ley 2279 de 2022 (Página 7)	\$ 0,00	\$ 122.140.009.704,00	\$ 122.140.009.704,00
MULTAS DE ASIGNACION DE INVERSION REGIONAL	Decreto 363 del 16 de marzo de 2023 (Página 29)	\$ 0,00	\$ 4.202.686,00	\$ 4.202.686,00
ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - PARÁGRAFO 8° TRANSITORIO DEL ART. 361 DE LA C.P.	Decreto 363 del 16 de marzo de 2023 (Página 16)	\$ 0,00	\$ 9.727.796.580,72	\$ 9.727.796.580,72
Restricción de gasto	Artículo 12 de la Ley 2279 de 2022	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
SALDO DISPONIBLE INICIAL		\$ 962.226.839.464,72	\$ 137.865.380.318,64	\$ 1.100.092.219.783,36
APROBACIONES				
VIGENCIAS FUTURAS BIENIO 2023 - 2024 ASIGNACION DE INVERSION REGIONAL 60%	Artículo 1 de la Resolución 15 del Consejo Departamental de Política Fiscal - CODFIS del 18 de mayo de 2022	\$ 0,00	\$ 20.379.456.155,00	\$ 20.379.456.155,00
VIGENCIAS FUTURAS BIENIO 2023 - 2024 ASIGNACIONES DIRECTAS	Artículo 1, 2 y 3 de la Resolución 22 del CODFIS del 29/06/2022 Artículos 1 y 2 de la Resolución 30 del CODFIS del 22/08/2022 Artículos 1 y 2 de la Resolución 39 del CODFIS del 14/09/2022 Artículo 1 de la Resolución 42 del CODFIS del 14/09/2022 Artículo 1 y 2 de la Resolución 48 del CODFIS del 10/10/2022 Artículo 1, 2 y 3 de la Resolución 056 del CODFIS del 10/11/2022 Artículo 2 de la Resolución 050 del CODFIS del 19/10/2022 Artículo 1 de la Resolución 047 del CODFIS del 29/09/2022 Artículo 1 de la Resolución 059 del CODFIS del 24/11/2022 Artículo 1 de la Resolución 062 del CODFIS del 07-12-2022	\$ 138.964.734.869,84	\$ 0,00	\$ 0,00
APROBACIONES DEMAS SECTORES	Aprobaciones del periodo comprendido entre el 01-01-2023 hasta el 31-12-2023	\$ 528.762.505.441,58	\$ 71.521.370.587,00	\$ 600.283.876.028,58



 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

APROBACIONES ENFOQUE ETNICO POBLACION INDIGENA	Artículo 1 y 4 del Decreto 457 del 13-12-2023	\$ 8.509.732.696,77	\$ 0,00	\$ 0,00
APROBACIONES ENFOQUE ETNICO COMUNIDADES NARP	Artículo 1 del Decreto 055 de 2023, Artículo 1 del Decreto 150 de 2023,	\$ 2.951.158.518,40		
APROBACIONES EDUCACIÓN SUPERIOR	Artículo 11 del Decreto 025 del 6 de febrero de 2023 Artículo 3 del Decreto 346 del 24 de agosto de 2023 Artículo 3 del Decreto 406 del 30 de octubre de 2023 Artículo 1 del Decreto 479 del 27 de diciembre de 2023	\$ 39.669.086.330,01	\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL, APROBACIONES	Incluye las vigencias futuras presupuestales y las aprobaciones del periodo	\$ 718.857.217.856,60	\$ 91.900.826.742,00	\$ 810.758.044.598,60
LIBERACIONES		\$ 0,00	\$ 2.908.744.845,00	\$ 2.908.744.845,00
SALDO	Saldos disponibles a la fecha de corte 31-12-2023	\$ 243.369.621.608,12	\$ 48.873.298.421,64	\$ 292.242.920.029,76

C. ANALISIS GENERAL


ANALISIS GENERAL RECURSOS EN TRAMITE PERIODO 01-07-2023 - 31-12-2023			
PROYECTOS APROBADOS			
SECTOR	PROYECTOS APROBADOS	VALOR APROBADO	PARTICIPACION
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	1	7.999.029.809,77	2,22%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	1	3.568.080.460,00	0,99%
CULTURA	1	7.889.748.172,00	2,19%
DEPORTE Y RECREACIÓN	1	1.241.201.623,00	0,34%
EDUCACIÓN	5	52.774.360.773,68	14,65%
GOBIERNO TERRITORIAL	5	36.793.538.111,00	10,21%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	1	510.702.887,00	0,14%
MINAS Y ENERGIA	9	35.479.782.012,00	9,85%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	4	45.667.949.684,00	12,68%
TRANSPORTE	3	14.431.140.268,00	4,01%
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	4	153.924.745.971,00	42,72%
TOTAL	35	360.280.279.771,45	100,00%
PROYECTOS AJUSTADOS			
CULTURA	1	407.263.313,00	1,12%
EDUCACIÓN	3	3.647.113.138,31	10,05%
MINAS Y ENERGIA	1	2.778.394.689,00	7,66%
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	3	29.446.707.574,16	81,17%
TOTAL	8	36.279.478.714,47	100,00%

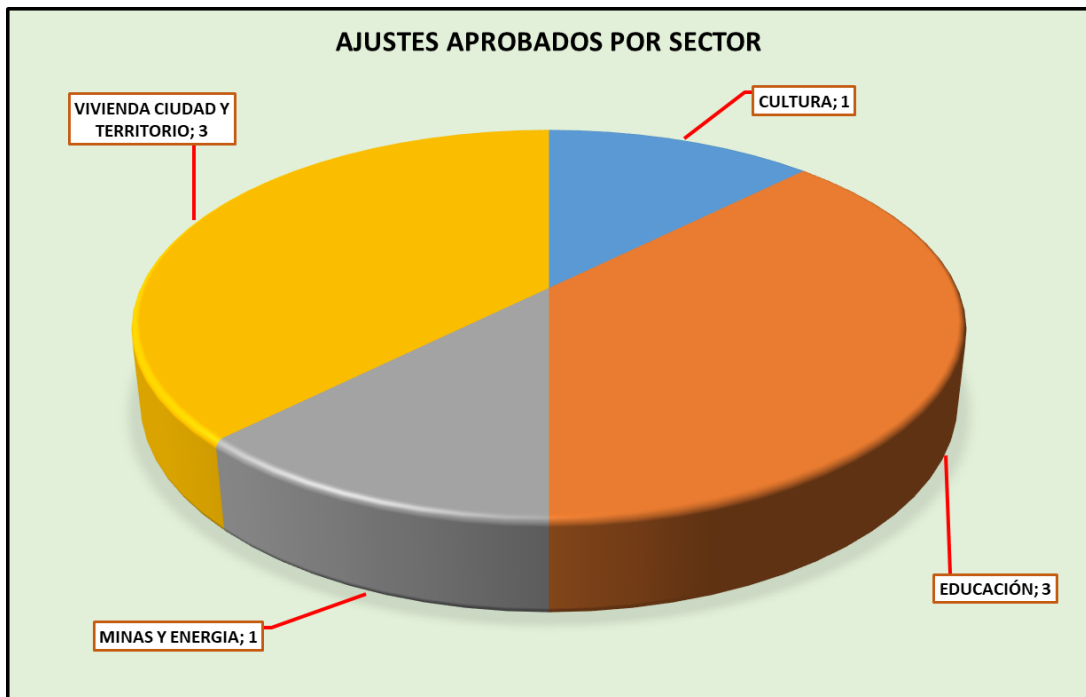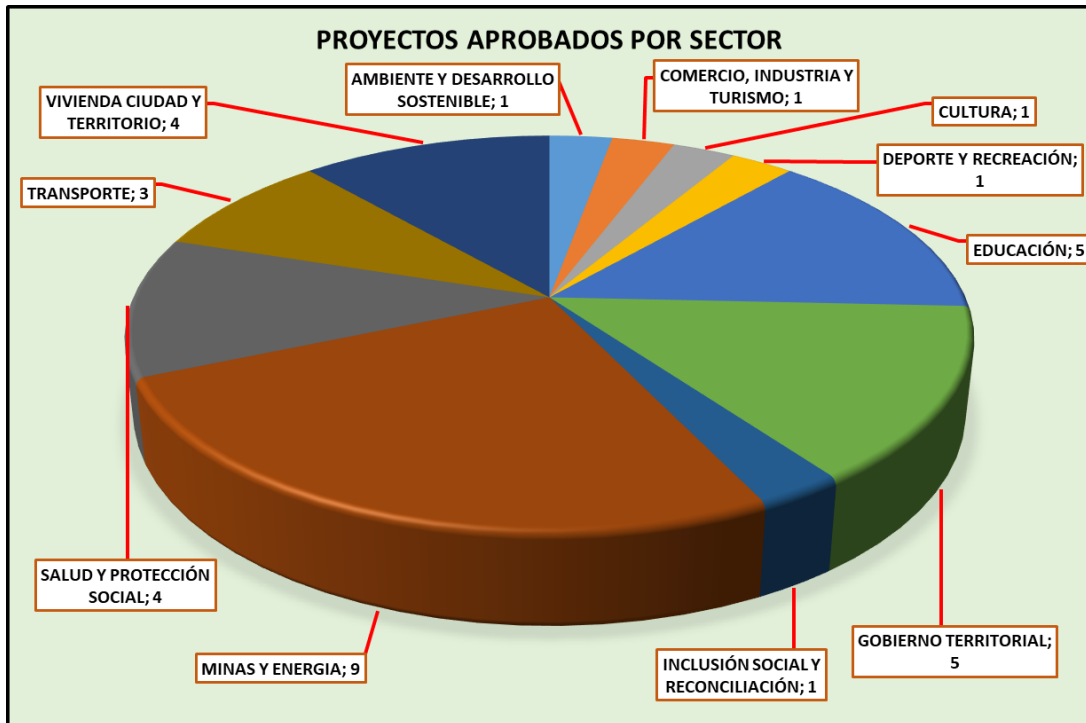

Rendición de Cuentas



Rendición de Cuentas

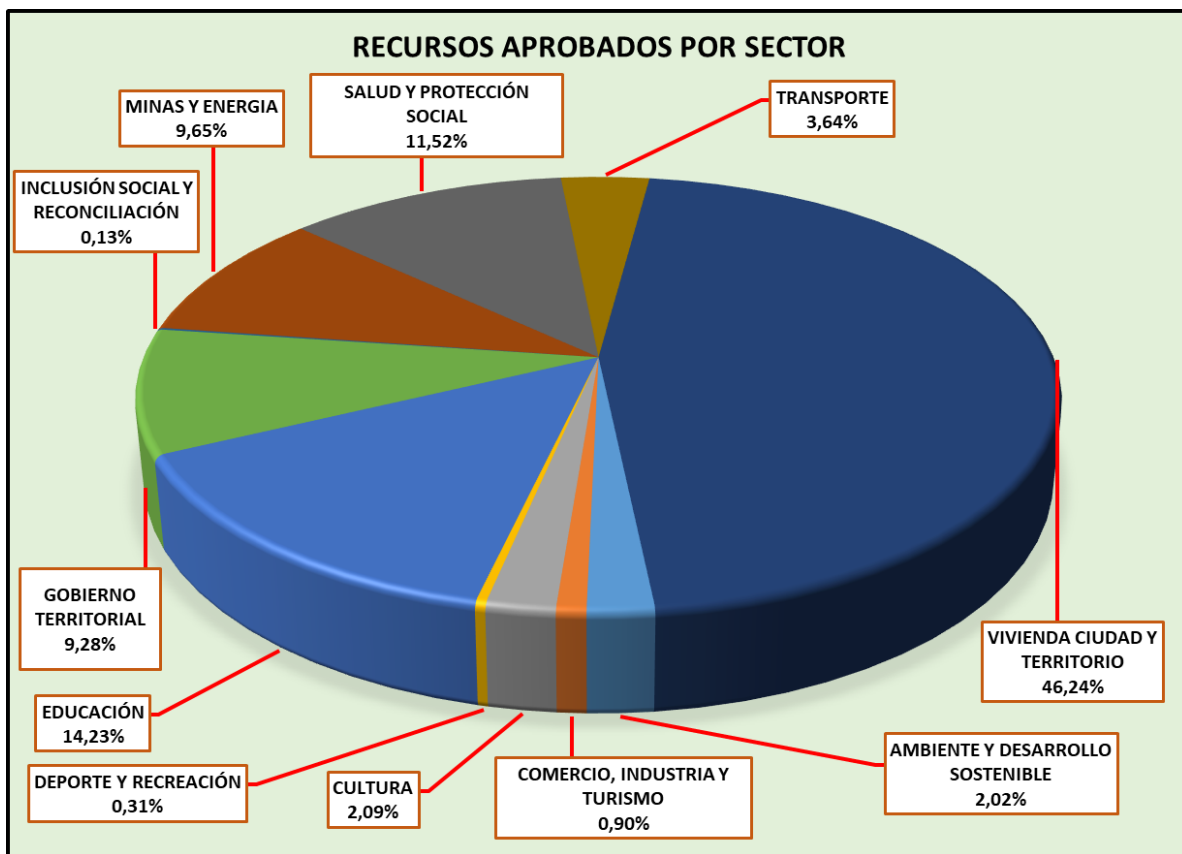RECURSOS APROBADOS POR SECTOR		
SECTOR	VALOR APROBADO	PARTICIPACION
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE	7.999.029.809,77	2,02%
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	3.568.080.460,00	0,90%
CULTURA	8.297.011.485,00	2,09%
DEPORTE Y RECREACIÓN	1.241.201.623,00	0,31%
EDUCACIÓN	56.421.473.911,99	14,23%
GOBIERNO TERRITORIAL	36.793.538.111,00	9,28%
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN	510.702.887,00	0,13%
MINAS Y ENERGIA	38.258.176.701,00	9,65%
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	45.667.949.684,00	11,52%
TRANSPORTE	14.431.140.268,00	3,64%
VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO	183.371.453.545,16	46,24%
TOTAL	396.559.758.485,92	100,00%



 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casánare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	



D. PROYECTOS APROBADOS DURANTE EL PERIODO DE CORTE

Proyecto No. 1

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850016
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO ARIPORO PARA LA INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LAS VEREDAS CUNEQUE Y EL PALMAR SECTOR ARIPORO DEL MUNICIPIO DE TÁMARA DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	lunes, 10 de julio de 2023
Valor total del proyecto	\$ 3.377.855.490,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 3.377.855.490,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 3.377.855.490,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE TAMARA
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	MUNICIPIO DE TAMARA
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,04%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	30,06%
Tiempo de ejecución físico aprobado	12 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	18 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	El proyecto impactará indicadores económicos de ingresos de la población permitiendo el tránsito de productos agrícolas de pequeña y mediana envergadura, reactivando la economía de las familias, permitirá el acceso a la educación de manera segura a la población infantil, acortará los tiempos de desplazamiento entre la vereda El Palmar y el casco urbano del municipio de Tamara y beneficiará el traslado de personas de tercera edad, enfermos y cualquier otra condición especial.
Pertinencia del proyecto	Se considera oportuno; teniendo en cuenta que los habitantes de las veredas Cuneque y el Palmar y el casco urbano del municipio de Tamara no cuentan con una infraestructura que permita la intercomunicación vial terrestre, la cual garantizará: <ul style="list-style-type: none"> • Disminución de tiempo de desplazamiento • Mejoramiento al acceso a los productos y víveres para el consumo humano y agrícola. • Propiciar condiciones óptimas para el acceso y la comercialización de bienes y servicios.

Proyecto No. 2



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850018
Nombre del proyecto	RECUPERACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS MEDIANTE HORAS

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	MÁQUINA AFECTADOS POR EVENTOS NATURALES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLANUEVA MONTERREY TRINIDAD SABANALARGA Y LA SALINA EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	lunes, 10 de julio de 2023
Valor total del proyecto	\$ 19.999.938.673,00
Sector de inversión	GOBIERNO TERRITORIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 19.999.938.673,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 19.999.938.673,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	86,96%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	37,65%
Tiempo de ejecución físico aprobado	6 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	10 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" Programa: 4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias. Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: ACCIONES DE OBRAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Pertinencia del proyecto	<p>El Departamento a través de la Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad Ciudadana / Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres, en aras de solucionar el desborde de la capacidad de respuesta a emergencias que se presentan en los municipios de Villanueva, Monterrey, Trinidad, Sabanalarga y la Salina; requiere de manera inmediata la recuperación de 40 puntos críticos afectados por fenómenos naturales en el Departamento, producto del fenómeno de la Niña, y ser intervenidos mediante el sistema de horas maquina a todo costo, con el fin de generar acciones de respuesta, mitigar el riesgo y minimizar las afectaciones generadas por la ocurrencia de fenómenos naturales en su territorio.</p>

Proyecto No. 3



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850019

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	lunes, 10 de julio de 2023
Valor total del proyecto	\$ 4.223.072.617,00
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 4.223.072.617,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 4.223.072.617,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	12 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	14 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Con la construcción de estas aulas se mejorarán las condiciones físicas y se garantizara el acceso adecuado a la Educación sin barreras físicas que impidan la movilidad de los alumnos, además de ello este proyecto cambiara las condiciones de infraestructura y calidad espacial dentro de la institución lo que incide directamente en la calidad de la educación que reciben los alumnos del municipio de Pore.
Pertinencia del proyecto	Se considera oportuno; teniendo en cuenta el alto déficit operacional de la infraestructura existente en el Colegio Rafael Uribe Uribe sede principal dentro del municipio de Pore.

Proyecto No. 4



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850022
Nombre del proyecto	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO VIAL QUE COMUNICA LAS VEREDAS YOPITOS (K6+00) ARENOSA ARGELIA PORFIA Y LA MAPORA (CAÑO GUARIMENA) DEL MUNICIPIO DE YOPAL; Y PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO CHARTE EN LA VEREDA LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	lunes, 10 de julio de 2023
Valor total del proyecto	\$ 1.325.488.198,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 1.325.488.198,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 1.325.488.198,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	9 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	15 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>Con el desarrollo de este proyecto se mejorará la calidad de vida de la población de los municipios de Maní y Yopal, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción de costos de movilización de personas y productos. • Aumento de la comercialización de productos agrícolas y ganaderos • Mejora en la atención médica y educación de la población.
Pertinencia del proyecto	El proyecto se considera pertinente; teniendo en cuenta los problemas de movilidad y transitabilidad en la vía Yopal – Maní, por esta razón es oportuna la intervención del departamento de Casanare.

Proyecto No. 5



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850024
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VILLA OLÍMPICA MANUEL ALEJANDRO ABRIL FERNÁNDEZ DEL MUNICIPIO HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	lunes, 10 de julio de 2023
Valor total del proyecto	\$ 1.241.201.623,00
Sector de inversión	DEPORTE Y RECREACIÓN
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 1.241.201.623,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 1.241.201.623,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	MUNICIPIO DE HATO COROZAL
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	MUNICIPIO DE HATO COROZAL
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	83,48%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	69,79%
Tiempo de ejecución físico aprobado	5 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	8 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disminución de problemas de salud pública asociados a la falta de actividad física. 2. Aumento de estilos de vida saludables 3. Disminución de los niveles de drogadicción en la comunidad
Pertinencia del proyecto	<p>El proyecto es pertinente, debido a que mejora y garantiza el acceso a la actividad física de la población que demanda estos espacios en óptimas condiciones en el casco urbano del municipio de Hato Corozal.</p> <p>Adicionalmente, el proyecto podría beneficiar municipios del Norte del departamento, que a la fecha no cuentan con acceso a escenarios deportivos.</p>

Proyecto No. 6



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850027
Nombre del proyecto	AMPLIACIÓN DE COBERTURAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BARRIO VILLA JULIANA Y SECTOR SUROCCIDENTAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 25 de julio de 2023
Valor total del proyecto	\$ 26.510.223.650,00
Sector de inversión	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 26.510.223.650,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 26.510.223.650,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATACION EN EJECUCION
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,40%
Tiempo de ejecución físico aprobado	12 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	16 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Nacional de Desarrollo, 2023-2026 Pacto por Colombia, pacto por la equidad. • Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Sistemas de alcantarillados construidos, ampliados

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare <small>REPUBLICA DE COLOMBIA</small> Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	y optimizados a nivel departamental. <ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Municipio "HATO COROZAL ALTO Y SOSTENIBLE" Programa: Ampliar el número de usuarios con cobertura al servicio de alcantarillado urbano en el cuatrienio
Pertinencia del proyecto	El proyecto tiene como alcance la construcción de 3.274,48 metros de colectores de alcantarillado pluvial, 22 pozos de inspección, 115 sumideros de alcantarillado pluvial, 1.357,25 metros de tubería para emisario a estructura de descarga del alcantarillado pluvial, una estructura de descarga con rejilla de retención de sólidos, la reposición y reparación de algunas redes y obras complementarias para el adecuado funcionamiento, tales como conformación de terraplén y conformación de vía. Lo anterior, conforme a los procedimientos y criterios normativos establecidos en la Resolución 0330 de 2017 "Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua y Saneamiento Básico – RAS" y la Resolución 0799 de 2021 "Por la cual se modifica la Resolución 0330 de 2017"

Proyecto No. 7



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850028
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TÚA SECTOR ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERREY DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	jueves, 24 de agosto de 2023
Valor total del proyecto	\$ 8.921.873.044,00
Sector de inversión	GOBIERNO TERRITORIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 8.921.873.044,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 8.921.873.044,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	35,83%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	6 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	11 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Con el desarrollo de este proyecto se disminuirá el riesgo por inundación y socavación para los habitantes del perímetro urbano del municipio de Monterrey, Departamento de Casanare:

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	<ul style="list-style-type: none"> Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas (Meta: 1). Proteger 800 personas que habitan sobre la margen izquierda del río Túa.
Pertinencia del proyecto	El proyecto se considera pertinente; teniendo en cuenta los problemas de Alto riesgo por inundación y socavación para los habitantes del perímetro urbano del municipio de Monterrey, Departamento de Casanare.



Proyecto No. 8

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850029
Nombre del proyecto	DOTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	jueves, 24 de agosto de 2023
Valor total del proyecto	\$ 3.125.026.207,75
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 3.125.026.207,75
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 3.125.026.207,75
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO"
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO"
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	46,61%
Tiempo de ejecución físico aprobado	6 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	13 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Adecuada prestación de servicios académicos a los estudiantes del programa de medicina veterinaria y zootecnia de UNITROPICO, mediante ambientes de aprendizaje fortalecidos.
Pertinencia del proyecto	El proyecto es pertinente ya que promueve y fortalece la educación superior en Casanare mediante el fortalecimiento del ambiente de aprendizaje en la clínica veterinaria de la universidad pública UNITROPICO. Se observa coherencia en la línea programática del Plan Nacional de Desarrollo: Programa 2202 - Calidad y fomento de la educación superior; y con el Plan de Desarrollo Departamental: Programa: 2.1.1. Casanare educada y con vocación para el futuro, y Subprograma: 2.1.2 Educación superior como apuesta para la generación de oportunidades.

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Proyecto No. 9

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850030
Nombre del proyecto	ADQUISICIÓN DE KITS DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA LA ATENCION DE FAMILIAS DAMNIFICADAS POR EVENTOS NATURALES Y/O ANTROPICOS, EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PUBLICA DECRETADA EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	jueves, 24 de agosto de 2023
Valor total del proyecto	\$ 5.998.184.530,00
Sector de inversión	GOBIERNO TERRITORIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 0,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 5.998.184.530,00
Valor total SGR	\$ 5.998.184.530,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	99,40%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	3 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	8 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" Programa: 4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias. Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: SERVICIOS DE ATENCION OPORTUNA A DAMNIFICADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES.
Pertinencia del proyecto	<p>El Departamento a través de la Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad Ciudadana / Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres, en aras de solucionar el desborde de la capacidad de respuesta a emergencias que se presentan en los 19 municipios del departamento de Casanare; requiere de manera inmediata adquirir kits de ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias para atender a 94.740 personas damnificadas y afectadas por fenómenos naturales en el Departamento, producto del fenómeno de la Niña, y ser atendidos mediante ayudas humanitarias alimentarias y no alimentarias de forma oportuna, con el fin de generar acciones de respuesta, mitigar el riesgo y minimizar las afectaciones generadas por la ocurrencia de fenómenos naturales en su territorio.</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Proyecto No. 10

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850031
Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS COMO ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO ECÓNOMICO DE LAS ORGANIZACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	jueves, 24 de agosto de 2023
Valor total del proyecto	\$ 5.593.243.635,00
Sector de inversión	GOBIERNO TERRITORIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 5.593.243.635,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 5.593.243.635,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	6 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	11 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<ul style="list-style-type: none"> • Mayores ingresos a la canasta familiar de los Organismos de Acción Comunal. • Aumento de las posibilidades de desarrollo económico en la región. • Organismos de Acción comunal con oportunidades de desarrollo económico y productivo. • Organismos de acción comunal con autonomía en la consecución de recursos para su funcionamiento. • Organismos de Acción comunal con estímulo a través de la implementación de unidades productivas
Pertinencia del proyecto	El proyecto es pertinente ya que se encuentra en concordancia con las metas contenidas en los planes de desarrollo de las entidades territoriales. Por otra parte, la entidad que ejecuta el proyecto cuenta con las competencias técnicas, legales y jurídicas y la inversión satisface las necesidades identificadas en la población objetivo.

Proyecto No. 11



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2021005850029
Nombre del proyecto	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE

Rendición de Cuentas

	CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	viernes, 25 de agosto de 2023
Valor total del proyecto	\$ 7.889.748.172,00
Sector de inversión	CULTURA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 7.889.748.172,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 7.889.748.172,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS
Estado del proyecto en GESPROY	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	14 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	19 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Se contará con infraestructura necesaria para fortalecer los hábitos de lectoescritura en la población estudiantil y juvenil en general. Ahorro en compra de textos escolares. Dado que se contará con la biblioteca municipal para consultas al público en general. Ahorro en costos evitados por investigación en puntos de internet.
Pertinencia del proyecto	Es pertinente contar con infraestructura adecuada que le permita a la población juvenil fortalecer las habilidades en lectoescritura a través de programas infantiles como animación a la lectura, actividades lúdicas, cine infantil entre otros.

Proyecto No. 12



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850023
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN Y SEGURIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD CON LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y DE APOYO HOSPITALARIO EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	viernes, 1 de septiembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 10.436.569.618,00
Sector de inversión	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 0,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 10.436.569.618,00
Valor total SGR	\$ 10.436.569.618,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare REPÚBLICA COLOMBIANA Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	7 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>Mejorar la prestación de servicios de salud con calidad, accesibilidad, oportunidad, pertinencia y seguridad a todos los habitantes del departamento de Casanare.</p> <p>Realizar la reposición de equipos que brinden un respaldo tecnológico eficiente, efectivo y seguro para los usuarios y que cumpla con el objetivo de brindarle a la población Casanareña atención integral y eficaz, previniendo complicaciones y mayores costos al sistema de salud.</p>
Pertinencia del proyecto	<p>El proyecto es pertinente en la medida en que los equipos biomédicos permitirán prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz en los habitantes del Departamento de Casanare.</p> <p>Los equipos biomédicos, dispositivos médicos, mobiliario asistencial, y equipos industriales de uso hospitalario se tuvo en cuenta los decretos 4725 de 2005 y 1011 de 2006, al igual que la Resolución 3100 de 2019 y de normatividad vigente.</p>

Proyecto No. 13



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850037
Nombre del proyecto	DESARROLLO DE CAPACIDADES EMPRENDEDORAS Y EMPRESARIALES PARA MICRONEGOCIOS RELACIONADOS CON LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	viernes, 1 de septiembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 3.568.080.460,00
Sector de inversión	COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 3.568.080.460,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 3.568.080.460,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	5 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	10 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Mejorar la inestabilidad económica de micro negocios cuya actividad comercial principal esté relacionada con la elaboración de productos de panadería, del Departamento de Casanare
Pertinencia del proyecto	Apoyar la reactivación productiva y comercial de 150 Micronegocios formales en contextos urbanos y rurales, que tengan como actividad comercial principal actividades relacionadas con la elaboración de productos de panadería, que cuenten con establecimiento de comercio fijo, en el Departamento de Casanare, que a su vez, preferiblemente tengan vinculadas personas en situación de vulnerabilidad, personas mayores, jóvenes, mujeres, indígenas, víctimas del conflicto armado, personas en condición de discapacidad y población NARP

Proyecto No. 14



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850033
Nombre del proyecto	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	jueves, 7 de septiembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 14.169.363.949,00
Sector de inversión	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 14.169.363.949,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 14.169.363.949,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	8 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	14 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	El proyecto impacta en la comunidad del Barrio San Antonio, área urbana del municipio de Maní; con base en el objetivo específico el cual corresponde a "Mejorar las redes del sistema de alcantarillado

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare <small>REPUBLICA COLOMBIANA</small> Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	<p>del barrio san Antonio con las condiciones técnicas y normas vigentes para garantizar el servicio adecuadamente de la comunidad" y teniendo en cuenta los fines principales planteados en el árbol de objetivos, se tiene como finalidad disminuir la contaminación y afectación del medio ambiente por el inadecuado manejo de las aguas lluvias, disminución de malos olores en la zona de influencia, así como la realización de obras complementarias (pavimentación) para garantizar la vida útil del alcantarillado pluvial.</p>
Pertinencia del proyecto	<p>Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la prestación del servicio público de alcantarillado sanitario y pluvial y obras complementarias del barrio San Antonio del área urbana del municipio de Maní, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes del Barrio. Por consiguiente, se considera pertinente, viable y oportuno la aprobación y ejecución del presente proyecto de inversión.</p>

Proyecto No. 15



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850036
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDADELA LA BENDICIÓN Y ZONA SUR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	jueves, 7 de septiembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 88.842.008.646,00
Sector de inversión	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 88.842.008.646,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 88.842.008.646,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	26 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	32 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>Teniendo en cuenta que las redes existentes de la Ciudadela la Bendición no cumplen con las normas técnicas para su mantenimiento y operación, lo cual conlleva a la necesidad de construir una nueva infraestructura que alcance el 100% de cobertura, que esté acorde a la normativa técnica vigente y que permita la prestación de un servicio óptimo para las familias que</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	allí residen.
Pertinencia del proyecto	Se considera oportuno; toda vez que el desarrollo de actividades urbanas sin la prestación de los servicios esenciales como el saneamiento básico acarrearía problemáticas de carácter jurídico, ambiental y sanitario, por el estancamiento de aguas debido a la disposición inadecuada, contribuyendo a la proliferación de vectores que conlleva a enfermedades, entre otros aspectos relevantes.

Proyecto No. 16



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850038
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EQUIPOS MUEBLES HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE FORMACIÓN EN EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 26 de septiembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 12.933.614.050,44
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 12.933.614.050,44
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 12.933.614.050,44
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO"
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO"
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	6 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	13 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Con la adquisición de dotación de proyecto: "dotación de ambientes de aprendizaje equipos, muebles, herramientas y maquinaria para el nuevo edificio de formación del SENA", se logrará el buen funcionamiento para el nuevo edificio de formación del Sena teniendo en cuenta que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.
Pertinencia del proyecto	El desarrollo del proyecto promueve el acceso libre y gratuito a la educación superior en el municipio de Yopal y en el Departamento de Casanare.

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	<p>Se fortalecerá la educación superior, en la ampliación sustancial de sus coberturas, mediante espacios dotados de manera que impacten positivamente la calidad de vida de los jóvenes y les permita acceder a estos servicios educativos, adoptando estrategias que les posibiliten permanecer hasta terminar sus estudios.</p>
--	--

Proyecto No. 17



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850041
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 26 de septiembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 2.629.909.659,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 2.629.909.659,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 2.629.909.659,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO EN EJECUCIÓN
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	46,28%
Tiempo de ejecución físico aprobado	5 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Nacional de Desarrollo, 2022 - 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” Programa: 2101 – Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible. • Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 “Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible” Meta Producto: Gasoducto ramal construido/Redes domiciliarias de gas combustible instaladas. • Plan de Desarrollo Municipio de Maní “YOPAL CIUDAD SEGURA 2020-2023” Programa: Yopal ciudad segura con servicio alumbrado público, energía y gas domiciliario • Municipio de Maní “CON CORAZON DE PUEBLO 2020-2023” Programa: Servicios públicos con calidad y eficiencia

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare <small>REPUBLICA DE COLOMBIA</small> Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Pertinencia del proyecto	<p>Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural del municipio de Maní y en el corregimiento de morichal en Yopal, disminuyendo costos en la cocción de los alimentos, y contribuyendo con la salud de sus pobladores al reducir el consumo de humos al cocinar y evitando además el transporte de los cilindros a lomo de mula, contribuyendo con la seguridad de las personas al ser un combustible más seguro que otros sistemas de cocción como la gasolina.</p>
---------------------------------	--

Proyecto No. 18



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850042
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL LOCAL DE VILLANUEVA CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	viernes, 20 de octubre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 37.150.030.630,00
Sector de inversión	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 23.845.289.335,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 3.304.741.295,00
Valor total SGR	\$ 27.150.030.630,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 10.000.000.000,00
Valor total otras fuentes	\$ 10.000.000.000,00
Entidad pública designada como ejecutora	RED SALUD CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	RED SALUD CASANARE
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	24 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	32 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>La alternativa busca garantizar la existencia de un Hospital de salud de Segundo nivel para la prestación de Servicios de Salud de los usuarios de la red pública de la zona sur y municipios aledaños de Boyacá y Meta.</p> <p>Con el propósito de mejorar la prestación de servicios de salud a la población del municipio de Villanueva, realizando acciones que permitan desarrollar el portafolio de servicios de mediana complejidad y la ampliación de la capacidad instalada y servicios</p>
Pertinencia del proyecto	<p>El proyecto articula los requerimientos técnicos para infraestructura hospitalaria, los requerimientos sectoriales para proyectos del sector salud y los requerimientos metodológicos, establecidos por el DNP para el sistema general de regalías.</p> <p>La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	acceso a los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud con Calidad y Continuidad
--	--

Proyecto No. 19



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850032
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL EN LAS VEREDAS SIRIVANA SAN RAFAEL DE GUANAPALO PALMARITO PIRICHIGUA CAÑAS LOS PATOS SAN FRANCISCO ARENITAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE Y AMPLIACIONES CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	viernes, 20 de octubre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 7.506.986.395,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 7.506.986.395,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 7.506.986.395,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	5 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	13 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Nacional de Desarrollo, 2022 - 2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida" Programa: 2101 - Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible. • Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Gasoducto ramal construido/Redes domiciliarias de gas combustible instaladas. • Plan de Desarrollo Municipio de san Luis de palenque "COMPROMISO DE TODOS 2020-202" Programa: servicios públicos diferentes a APSB. • Plan de Desarrollo Municipio de Trinidad "LA FUERZA DEL CAMBIO 2020-2023" Programa: Trinidad un pacto de cambio para el desarrollo de infraestructura.
Pertinencia del proyecto	Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural del municipio de san Luis de Palenque y el casco urbano del municipio de Trinidad,

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare <small>UNIVERSIDAD</small> Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	disminuyendo costos en la cocción de los alimentos, y contribuyendo con la salud de sus pobladores al reducir el consumo de humos al cocinar y evitando además los costos de transporte de los cilindros, contribuyendo con la seguridad de las personas al ser un combustible mas seguro que otros sistemas de cocción como la gasolina.
--	---

Proyecto No. 20



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850035
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA MORALITO PALMARITO LA VIRGEN Y PIEDECUESTA DEL MUNICIPIO DE NUNCHIA DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	viernes, 20 de octubre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 3.801.556.818,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 3.801.556.818,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 3.801.556.818,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	6 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	13 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo, 2018 - 2022 "Pacto por Colombia, pacto por la equidad" Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica. Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 "Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible" Meta Producto: Gasoducto ramal construido/Redes domiciliarias de gas combustible instaladas. Plan de Desarrollo Municipio de Yopal PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "POR EL NUNCHIA QUE SOÑAMOS 2020-2023
Pertinencia del proyecto	Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural del municipio de Nunchia, disminuyendo costos en la cocción de los alimentos, y contribuyendo con la salud de sus pobladores al reducir el

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare <small>REPUBLICA DE COLOMBIA</small> Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	consumo de humos al cocinar y evitando además el transporte de los cilindros a lomo de mula, contribuyendo con la seguridad de las personas al ser un combustible más seguro que otros sistemas de cocción como la gasolina.
--	--

Proyecto No. 21

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850048
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA LA POBLACIÓN MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS INDUSTRIALES Y MOBILIARIO EN LA SEDE DE MONTERREY SABANALARGA Y TÁMARA DE RED SALUD CASANARE E.S.E CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	lunes, 30 de octubre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 5.181.151.930,00
Sector de inversión	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 5.181.151.930,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 5.181.151.930,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	RED SALUD CASANARE
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	RED SALUD CASANARE
Estado del proyecto en GESPROY	CONTRATADO SIN ACTA DE INICIO
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	7 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	11 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>Satisfacción de los usuarios de los Centros de Salud de Monterrey, Sabanalarga y Támara.</p> <p>Disminución en la morbilidad secundaria y las complicaciones derivadas de enfermedades prevenibles con diagnóstico y tratamiento oportunos en los habitantes de los municipios de Monterrey, Sabanalarga y Támara del departamento de Casanare.</p>
Pertinencia del proyecto	<p>El proyecto es pertinente en la medida en los equipos biomédicos permitirán garantizar la prestación de servicios para prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz en los habitantes municipios de Monterrey, Sabanalarga y Támara.</p> <p>Respaldo tecnológico eficiente que cumpla con el objetivo de mejorar el estado del equipamiento en cumplimiento de los estándares de habilitación para el nivel de atención de los Centros de Atención primaria de Monterrey, Sabanalarga y Támara (Decretos 4725 de 2005 y 1011 de 2006, Resolución 3100 de</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	2019)
--	-------

Proyecto No. 22



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850050
Nombre del proyecto	DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICA UNITRÓPICO DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE YOPAL
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	lunes, 30 de octubre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 37.126.093.134,49
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 28.626.093.134,49
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 28.626.093.134,49
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 8.500.000.000,00
Valor total otras fuentes	\$ 8.500.000.000,00
Entidad pública designada como ejecutora	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO"
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO"
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	8 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Con la adquisición de la dotación de proyecto: "DOTACIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE COMO ACCIÓN DE FORTALECIMIENTO EDUCATIVO PARA LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR PUBLICA "UNITROPICO" DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE". se logrará una mayor y mejor cobertura académica en la universidad, brindando equipos y herramientas a la población estudiantil de calidad teniendo en cuenta su transformación de universidad privada a pública y que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos, y de sus deberes. Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad.
Pertinencia del proyecto	El desarrollo del proyecto promueve el acceso libre y gratuito a la educación superior en el municipio de Yopal y en el Departamento de Casanare. Se fortalecerá la educación superior, en la ampliación sustancial

Rendición de Cuentas

	de sus coberturas, mediante espacios dotados de manera que impacten positivamente la calidad de vida de los jóvenes y les permita acceder a estos servicios educativos, adoptando estrategias que les posibiliten permanecer hasta terminar sus estudios.
--	---

Proyecto No. 23

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850044
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE GAS NATURAL PARA LA VEREDA SAN RAFAEL Y AMPLIACION DE REDES EN LAS VEREDAS TASAJERA VERDE SAN ISIDRO BANCO MATALARGA GARZON BRISAS REGALITO MIRALINDO DEL MUNICIPIO DE PORE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	miércoles, 1 de noviembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 4.754.885.666,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 4.754.885.666,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 4.754.885.666,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	6 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	13 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Nacional de Desarrollo, 2022 - 2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida” Programa: 2101 - Acceso al servicio público domiciliario de gas combustible. • Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 “Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible” Meta Producto: Gasoducto ramal construido/Redes domiciliarias de gas combustible instaladas. • Plan de Desarrollo Municipio de Pore “UN GOBIERNO PARA TODOS 2020-2023” Programa: todos con servicios públicos.
Pertinencia del proyecto	Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector rural del municipio de Pore, disminuyendo costos en la cocción de los alimentos, y contribuyendo con la salud de sus pobladores al reducir el consumo de humos al cocinar y evitando además el transporte de

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	



	los cilindros a lomo de mula, contribuyendo con la seguridad de las personas al ser un combustible más seguro que otros sistemas de cocción como la gasolina.
--	---

Proyecto No. 24



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850047
Nombre del proyecto	AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS BELLA VISTA BUENA VISTA ISIMENA IGUARO TIERRA GRATA LA TIGRANA GUADUALITO BRISAS DEL LLANO MARENAO GUAFAL LA HORQUETA CAÑO RICO LA VIGIA Y PALO NEGRO MUNICIPIO DE MONTERREY CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	viernes, 24 de noviembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 6.743.778.155,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 6.743.778.155,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 6.743.778.155,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	11 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	18 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Aumento de la cobertura del servicio de energía eléctrica para las comunidades rurales del municipio de Monterrey.
Pertinencia del proyecto	El proyecto es pertinente ya que aumenta la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Departamento de Casanare, mediante la ampliación de redes eléctricas del área rural del municipio de Monterrey. Se observa coherencia en la línea programática del Plan Nacional de Desarrollo: 2102 - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica; con el Plan de Desarrollo Departamental: Programa: 3.2.1. Energía para el desarrollo de Casanare, y Subprograma: 3.2.1.1. Energía confiable y sostenible.

Proyecto No. 25

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850054
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 2 DE LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	miércoles, 6 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 24.403.149.726,00
Sector de inversión	VIVIENDA CIUDAD Y TERRITORIO
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 24.403.149.726,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 24.403.149.726,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CASANARE "ACUATODOS" S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	8 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	14 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan Nacional de Desarrollo, 2022- 2026 “Colombia potencia Mundial de la vida” Programa: 4003 - Acceso a la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico. • Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 “Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible” Meta Producto: Sistemas de Alcantarillado Construidos, Ampliados y Optimizados a nivel departamental y Sistemas de Acueductos Construidos, Ampliados y Optimizados a nivel departamental. • Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023 “Yopal Ciudad Segura”, estrategia Agua Potable y Saneamiento Básico y Programa Yopal Garantiza Acceso a Servicios Públicos con Calidad, Cobertura y Continuidad.
Pertinencia del proyecto	<p>Con el desarrollo del proyecto se busca mejorar el servicio agua potable y saneamiento básico para 12703 habitantes de la comuna VII barrios Salome II, Getsemani, Piedemonte, Bosques de Achagua, Xiruma II y Bosques de Guarataro del municipio de Yopal, que se ven afectadas por rebosamientos del alcantarillado en diferentes puntos del sector al tener pozos sépticos, incrementando la proliferación de vectores que afectan la salud humana.</p>



 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Proyecto No. 26

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850026
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE UN CRUCE ELEVADO PARA EL PASO DE LA RED DE GAS SOBRE EL RÍO PAUTO PARA EL TRAYECTO YOPAL - PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 12 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 3.894.387.736,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 3.894.387.736,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 3.894.387.736,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	8 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	15 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Con la construcción de un cruce elevado sobre el Río Pauto sobre el trayecto Yopal – Paz de Aripuro, Departamento de Casanare, que soportan la tubería que hace parte de la red de gas natural, se pretenden minimizar los riesgos, teniendo en cuenta que actualmente que la tubería de gas está adosada al puente vehicular sobre el Río Pauto de la vía marginal de la selva que comunica los municipios de Yopal con Paz de Aripuro. De igual forma se quiere garantizar un mejor servicio público de gas natural en la zona norte del Departamento.
Pertinencia del proyecto	Se considera oportuno; teniendo en cuenta que con la construcción del cruce elevado se garantiza la continuidad del servicio de gas natural a los 20.000 usuarios de los municipios de Pore, Paz de Aripuro, Trinidad y San Luis de Palenque, según datos de ENERCA

Proyecto No. 27



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850045
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN OBRAS GEOTÉCNICAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA EN EL TRAYECTO QUE CONDUCE AL SECTOR EL MIRADOR DE LA VEREDA CUARTO ÚNETE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 12 de diciembre de 2023

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare REPÚBLICA COLOMBIANA Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Valor total del proyecto	\$ 2.278.482.759,00
Sector de inversión	GOBIERNO TERRITORIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 2.278.482.759,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 2.278.482.759,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	7 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>Con el desarrollo de este proyecto se disminuirá los factores de riesgo de desastre en la población de la vereda Cuarto Únete y población urbana visitante al sector el Mirador en el municipio de Aguazul departamento de Casanare:</p> <ul style="list-style-type: none"> Obras de infraestructura para la reducción del riesgo de desastres realizadas (Meta: 1) 29.989 personas beneficiadas por las obras geotécnicas para la mitigación del riesgo por movimientos en masa.
Pertinencia del proyecto	El proyecto se considera pertinente; teniendo en cuenta los elevados factores de riesgo de desastre en la población de la vereda Cuarto Únete y población urbana visitante al sector el Mirador en el municipio de Aguazul departamento de Casanare.

Proyecto No. 28



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850053
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CHITAMENA ALTO DELICIAS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	viernes, 22 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 13.834.376.238,00
Sector de inversión	TRANSPORTE
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 0,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 9.727.796.580,00
Valor total SGR	\$ 9.727.796.580,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 4.106.579.658,00
Valor total otras fuentes	\$ 4.106.579.658,00
Entidad pública designada como ejecutora	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Entidad pública responsable de contratar la interventoría	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN – RAP LLANOS
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	10 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	15 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Ahorro en tiempos de viaje, teniendo en cuenta el mejoramiento de la vía. Ahorro en gastos de mantenimiento de vehículos.
Pertinencia del proyecto	Se considera oportuno; teniendo en cuenta la dificultad en la intercomunicación terrestre se ha generado aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de productos del municipio, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona.

Proyecto No. 29



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850056
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS VEREDAS EL TRIUNFO Y LA COLMENA MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 26 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 1.868.159.632,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 1.868.159.632,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 1.868.159.632,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	7 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	14 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera: Plan Nacional de Desarrollo, 2022-2026 “Colombia potencia

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casánare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	<p>mundial de la vida” Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica.</p> <p>Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 “Es el Tiempo de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible” Meta Producto: Redes de alumbrado público construidas, mejoradas, ampliadas y/o mantenidas.</p> <p>Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023 “Juntos construimos más Gas y Energía para Villanueva”. Meta Producto: Ampliar, Optimizar y/o modernizar el sistema de alumbrado público.</p>
Pertinencia del proyecto	<p>El alcance del proyecto contempla dentro de sus componentes la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión y transformadores de distribución para Las Veredas el Triunfo y la Colmena del municipio de Villanueva. Beneficiando a 1972 habitantes.</p>

Proyecto No. 30



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850057
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS SAN RAFAEL Y PICÓN EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 26 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 1.704.201.933,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 1.704.201.933,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 1.704.201.933,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	5 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>El proyecto contribuye al cumplimiento de Metas de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan Nacional de Desarrollo, 2022-2026 “Colombia potencia mundial de la vida” Programa: 2102 - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica. Plan de Desarrollo Departamental 2020- 2023 “Es el Tiempo

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	<p>de Casanare Productivo, Equitativo y Sostenible” Meta Producto: REDES DEL SISTEMA DE TRANSMISION REGIONAL Y DISTRIBUCION LOCAL AMPLIADA.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plan de Desarrollo Municipal 2020- 2023 “YOPAL CIUDAD SEGURA 2020 – 2023”. Programa: 2.7.4 YOPAL CIUDAD SEGURA CON SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO, ENERGÍA Y GAS DOMICILIARIO. <p>Meta Producto: Ampliación de redes de energía eléctrica Indicador: Metros Lineales de red construida</p>
Pertinencia del proyecto	<p>El alcance del proyecto contempla dentro de sus componentes la construcción de redes eléctricas de media y baja tensión y transformadores de distribución para la urbanización Quintas de la Sabana del municipio de Aguazul. Beneficiando a 146 familias que corresponden a 584 habitantes.</p>

Proyecto No. 31



ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850059
Nombre del proyecto	OPTIMIZACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE MEDIANA COMPLEJIDAD PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD SEGURIDAD Y OPORTUNIDAD A LA COMUNIDAD EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 26 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 2.900.197.506,00
Sector de inversión	SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 0,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 2.900.197.506,00
Valor total SGR	\$ 2.900.197.506,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA - HORO
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	7 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	<p>Aumentar la calidad en la prestación del servicio de salud de mediana complejidad para los usuarios del Hospital Regional de la Orinoquia del departamento de Casanare.</p> <p>Realizar la reposición de equipos biomédicos, mobiliario hospitalario, dispositivos médicos e instrumental, que brinden un respaldo tecnológico eficiente, efectivo y seguro para los usuarios y que cumpla con el objetivo de mejorar el estado del</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	<p>equipamiento e introducir nueva tecnología, generando una mayor competitividad del Hospital Regional de la Orinoquia y la satisfacción del usuario final.</p>
Pertinencia del proyecto	<p>El proyecto es pertinente en la medida en los equipos biomédicos permitirán prevenir, diagnosticar, tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y eficaz en los habitantes del Departamento de Casanare.</p> <p>Los equipos biomédicos, dispositivos médicos, mobiliario asistencial, e instrumentación quirúrgica se tuvo en cuenta los decretos 4725 de 2005 y 1011 de 2006, al igual que la Resolución 3100 de 2019 y de normatividad vigente.</p>

Proyecto No. 32

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850060
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN DOBLE CIRCUITO A NIVEL DE 13.2 KV EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	martes, 26 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 2.575.916.018,00
Sector de inversión	MINAS Y ENERGIA
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 2.575.916.018,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 2.575.916.018,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE ENERCA S.A.E.S.P.
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	6 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	13 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	Mayor confiabilidad y calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica para la comunidad urbana del municipio de Maní.
Pertinencia del proyecto	<p>El proyecto es pertinente ya que aumenta la cobertura del servicio de energía eléctrica en el Departamento de Casanare, mediante la construcción de redes para suministrar el servicio de energía a la comunidad de zona urbana de Maní.</p> <p>Se observa coherencia en la línea programática del Plan Nacional de Desarrollo: 2102 - Consolidación productiva del sector de energía eléctrica; con el Plan de Desarrollo Departamental: Programa: 3.2.1. Energía para el desarrollo de Casanare, y Subprograma: 3.2.1.1. Energía confiable y sostenible.</p>



 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Proyecto No. 33

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023005850061
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA UN BLOQUE DE AULAS BATERÍA DE BAÑOS CAFETERÍA Y ESPACIOS DE SERVICIOS DENOMINADO BLOQUE BETA EN LA GRANJA EL REMANSO DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO DEPARTAMENTO DE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	miércoles, 27 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 3.866.554.764,00
Sector de inversión	EDUCACIÓN
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 3.866.554.764,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 3.866.554.764,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO"
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO "UNITROPICO"
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	8 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	12 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	NO
Impacto del proyecto	La ejecución del proyecto generara un impacto positivo, ya que se garantiza el fortalecimiento de los servicios académicos y de permanencia que mejorara las condiciones de los estudiantes, tanto en pregrado, postgrado y educación no formal. El diseño del proyecto está basado en las necesidades identificadas por la comunidad universitaria (Estudiantes, docentes, egresados, administrativos)
Pertinencia del proyecto	Se considera oportuno; teniendo en cuenta el alto déficit operacional de la infraestructura existente en la sede de la granja el remanso de la universidad internacional del trópico americano, departamento de Casanare"

E. DESTINACIÓN DE RECURSOS DEL SGR PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN CON ENFOQUE ÉTNICO (cuando aplique)¹

¹ La identificación individual de enfoque étnico por proyectos se encuentra dentro de las variables de los proyectos aprobados durante el periodo de corte del presente informe.

	DEPARTAMENTO DE CASANARE	
	Rendición de Cuentas	



Recursos destinados a financiar este tipo de proyectos que cumplan con el objetivo de propiciar la inclusión, equidad, participación y el desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y de las comunidades indígenas, de conformidad con lo capítulos II y III de la ley 2056 de 2020.

SALDOS POBLACION NARP - ASIGNACIONES DIRECTAS 20%			
ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
(+) A	DISPONIBILIDAD INICIAL BIENIO 2021-2022	1% de lo asignado en la Ley 2072 de 2020	\$3.984.537.043,67
(+) B	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) DEPARTAMENTO DE CASANARE	1% de lo asignado en la Ley 2279 de 2022	\$ 5.281.991.339,98
(-) C	Restricción de gasto	Artículo 12 de la Ley 2279 de 2022	\$ 2.112.796.535,99
(-) D	Aprobaciones enfoque étnico	Artículo 1 del Decreto 055 de 2023, Artículo 1 del Decreto 150 de 2023,	\$ 2.951.158.518,40
(=) E	TOTAL ASIGNACION DISPONIBLE	A + B - C - D	\$ 4.202.573.329,26

SALDOS POBLACION INDIGENA - ASIGNACIONES DIRECTAS 20%			
ITEM	CONCEPTO	DESCRIPCION	VALOR
(+) A	DISPONIBILIDAD INICIAL BIENIO 2021-2022	1% de lo asignado en la Ley 2072 de 2020	\$ 4.480.491.654,49
(+) B	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR) DEPARTAMENTO DE CASANARE	1% de lo asignado en la Ley 2279 de 2022	\$ 7.471.244.791,03
(-) C	Restricción de gasto	Artículo 12 de la Ley 2279 de 2022	\$ 2.988.497.916,41
(-) D	Aprobaciones enfoque étnico	Artículo 1 y 4 del Decreto 457 del 13-12-2023	\$ 8.509.732.696,77
(=) D	TOTAL ASIGNACION DISPONIBLE	A + B - C - D	\$ 453.505.832,34

Proyecto No 1

Código BPIN	2023I00010059
Nombre del proyecto	ADECUACIÓN Y EL MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA DE CASANARE - ORIC EN EL MUNICIPIO DE YOPAL EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE CASANARE
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	miércoles, 13 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 510.702.887,00
Sector de inversión	INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 510.702.887,00
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 510.702.887,00
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "AREMCA"
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "AREMCA"
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	4 MESES
Tiempo de ejecución financiero aprobado	8 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Enfoque Diferencial	SI
Impacto del proyecto	Mejoran las condiciones de la infraestructura física de la organización regional indígena –ORIC en el municipio de Yopal, departamento de Casanare
Pertinencia del proyecto	La pertinencia del proyecto obedece a que las comunidades Indígenas del Departamentos de Casanare pretenden que la infraestructura física de la ORIC, genere un entorno de seguridad y de salvaguarda en caso de necesidades.



Proyecto No 2

ITEM	DESCRIPCIÓN
Código BPIN	2023100010060
Nombre del proyecto	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES TENDIENTES A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD INDÍGENA RESGUARDO CAÑO MOCHUELO CON LA REFORESTACIÓN PRODUCTIVA EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
Fecha del acto administrativo de aprobación del proyecto	miércoles, 13 de diciembre de 2023
Valor total del proyecto	\$ 7.999.029.809,77
Sector de inversión	AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Valor Asignaciones Directas 20%	\$ 7.999.029.809,77
Valor Asignación de Inversión Regional 60%	\$ 0,00
Valor total SGR	\$ 7.999.029.809,77
Valor Recursos Propios	\$ 0,00
Valor Otras Fuentes	\$ 0,00
Valor total otras fuentes	\$ 0,00
Entidad pública designada como ejecutora	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "AREMCA"
Entidad pública responsable de contratar la interventoría	ASOCIACION REGIONAL DE MUNICIPIOS DEL CARIBE "AREMCA"
Estado del proyecto en GESPROY	SIN CONTRATAR
Estado de ejecución físico (GESPROY)	0,00%
Estado de ejecución financiero (GESPROY)	0,00%
Tiempo de ejecución físico aprobado	3 AÑOS
Tiempo de ejecución financiero aprobado	3 AÑOS Y 6 MESES
Resolución de cierre (si aplica).	0,00
Reintegros (Saldo no ejecutado del proyecto)	N / A
Enfoque Diferencial	SI
Impacto del proyecto	Aumentar las coberturas vegetales en áreas y ecosistemas estratégicos de zonas abastecedoras de vida en Paz de Ariporo.
Pertinencia del proyecto	La pertinencia del proyecto obedece a que se quiere revertir la erosión del suelo y revivir las cuencas hidrográficas. Los árboles del bosque permiten frenar el viento y la caída del agua, protegen el suelo de la erosión.

F. AJUSTES

Proyecto No 1

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO JOSÉ EUSTACIO RIVERA Y LA URBANIZACIÓN ANTONIO LECCIONI DEL

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE
Código BPIN	2021005850092
Valor total del proyecto	\$ 29.524.508.988,00
Causal de ajuste	<p>De acuerdo a la información reportada por el ejecutor y por la interventoría contratada se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es el incremento de mayores cantidades de obra las cuales son necesarias para el adecuado funcionamiento hidráulico del sistema de alcantarillado pluvial en el barrio José Eustasio Rivera debido a que contractualmente no se encuentra establecido ejecutar actividades del Componente 2 OBRAS COMPLEMENTARIAS; en este barrio el cual hace parte esencial en el objeto del citado contrato de obra.</p> <p>Con la implementación de los ajustes solicitados para la ejecución de actividades de construcción de obras complementarias en el BARRIO JOSÉ EUSTASIO RIVERA DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ se proyecta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SISTEMA DE AGUA POTABLE: Realizar la instalación y/o reparación de las acometidas domiciliarias de acueducto para garantizar el suministro de agua potable en los sectores que se presenten averías por la realización de las excavaciones durante la construcción de la estructura del pavimento • SISTEMA SANITARIO: Realizar la instalación y/o reparación de las domiciliarias del alcantarillado sanitario para garantizar la evacuación de las aguas residuales de origen doméstico al sistema de alcantarillado sanitario en los sectores que se presenten averías por la realización de las excavaciones durante la construcción de la estructura del pavimento • SISTEMA PLUVIAL: Para realizar la recolección de las aguas lluvias se plantea la construcción de sumideros tipo SL-250 con la respectiva tubería de diámetro 12" en los sectores que sea necesario de acuerdo a los perfiles viales y pendientes de las vías. • OBRAS COMPLEMENTARIAS: Se plantea realizar las actividades necesarias para las reparaciones de energía eléctrica y gas natural averiadas por la realización de las excavaciones para el posterior suministro e instalación de la estructura del pavimento en concreto rígido de las vías ubicadas entre las diagonales 4A a la 4E y la avenida circunvalar y entre la avenida circunvalar a la carrera 20 de acuerdo a las especificaciones y diseño de la estructura establecida en el proyecto.

Cuando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 21.031.717.895,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 26.031.717.895,00
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ 3.492.791.093,00	\$ 3.492.791.093,00
TOTAL	\$ 21.031.717.895,00	\$ 8.492.791.093,00	\$ 29.524.508.988,00

Proyecto No 2

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2022005850029
Valor total del proyecto	\$ 105.064.828.744,00

Rendición de Cuentas



Causal de ajuste	<p>De acuerdo a la información reportada por el ejecutor y por la interventoría contratada se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es la necesidad técnica de traslado de ubicación del punto de descarga del colector de entrega de aguas residuales domesticas de la zona de expansión del sitio inicialmente propuesto; lo anterior debido al reciente colapso del colector existente en la calle 40 con carrera 19, donde se pretendía hacer la conexión; de igual forma fue necesario llevar a cabo también la reubicación de la EBAR proyectada, puesto que se debe garantizar que la capacidad de bombeo del sistema siga funcionamiento óptimamente. Soportan dicho ajuste la certificación de disponibilidad expedida por la dirección técnica operativa de acueducto y alcantarillado de la EAAA EICE - E.S.P de fecha 4 de agosto de 2023 y suscrita por Slayneth Niño Díaz en su calidad de directora. La certificación suscrita por Javier Vergara Mariño, representante legal de Consorcio Nororiental en calidad de interventoría contratada. De igual forma: el Informe de ajuste de diseño de redes de alcantarillado sanitario (93 folios). informe PAGA (88 folios), Informe de ajuste Eléctrico aprobado de Enerca de fecha 13 de septiembre de 2023 (124 folios), Estudio de suelos y geotecnia (294 folios), informe topográfico (240 folios), especificaciones técnicas (27 folios), proceso constructivo (38 folios), memoria de cantidades (215 folios), planos del ajuste presentado (15 hidráulicos, 7 eléctricos). La certificación de fecha 30 de agosto de 2023 suscrita Oved Quiroga Flórez en calidad de gerente de ACUATODOS SA ESP., entidad ejecutora; donde se expresa que el presente ajuste no afecta los términos iniciales del proyecto, no modifica el objeto, ni altera el alcance, al contrario su ejecución robustece el funcionamiento del mismo, garantiza el cumplimiento del objetivo general y específicos del proyecto, pues brinda mayores condiciones de accesibilidad, seguridad, protección al usuario y a las instalaciones construidas, manteniéndose la población objetivo del proyecto.</p> <p>Teniendo en cuenta que el proyecto contempla el traslado de la EBAR y nuevo trazado de la línea de impulsión, se incluye el permiso de paso de tubería para tres predios: - Villa Susan, poseedor Oscar Jiménez Vela CC 17.102.863 de Bogotá. Fecha documento 13 de febrero de 2023 -Llamarada, poseedor Inversiones DLEL Martines S. en C, en liquidación con Nit. 830.124.812-8, Fecha documento 8 de febrero de 2023. El Delirio, poseedor Orlando Alarcón Rojas CC 9.521.694 de Sogamoso. Fecha documento 23 de marzo de 2023. La Pistola, poseedor Mireya del Carmen Archila de Martinez, identificada con cedula de ciudadanía No. 23,739.841 de Yopal Casanare, fecha del documento 21 de septiembre de 2023.</p> <p>Se adjunta de igual forma certificación de uso del suelo suscrita por la oficina asesora de planeación Municipal de fecha 14 de septiembre suscrita por Sonia Sidney Ruiz García, de igual forma se incluye certificación de uso de suelo expedido por la Curaduría Urbana No. 1 de fecha 15 de septiembre 2023 donde se expresa uso compatible del predio Finca Villa Daniela-Picos, donde se ubicará la EBAR.</p>
-------------------------	--

Cuando sea de valores o fuente de financiación:



AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 81.546.653.402,00	\$ 23.518.175.342,00	\$ 105.064.828.744,00
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 81.546.653.402,00	\$ 23.518.175.342,00	\$ 105.064.828.744,00

Proyecto No 3

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN LLANO LINDO DE 10 MVA A 34.5/13.8 KV Y ALIMENTADOR PRINCIPAL A 34.5 KV EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casánare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	DE CASANARE
Código BPIN	2017005850059
Valor total del proyecto	\$ 10.987.560.616,00
Causal de ajuste	<p>En el informe final de la interventoría, con contrato de consultoría No 542 de 2018, SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES LIMITADA "SECOB LTDA, representado legalmente por DIEGO GERARDO ROJAS GÓMEZ identificado con cédula de ciudadanía No.74.859.089 de Yopal, manifiesta y certifica mediante el Informe final de Interventoría, que él contratista de obra UNION TEMPORAL SUBESTACIÓN LLANO LINDO con N.IT 901.240.197-1, representado legalmente por YEFERSON BELISARIO SALAZAR SUAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No 41.118.531.535 de Yopal, dentro de las actividades del contrato de obra No 539 de 2018, cumplió parcialmente el objeto del contrato, soportado con Acta No. 15 de terminación, Acta No. 16 de Recibo Final, y Acta No. 17 de Liquidación, donde se recibió un total del 71.95% de las obras programadas, dejando pendiente por ejecutar 28.05%, considerando, que estas actividades son necesarias para la terminación y dar cumplimiento del objetivo general del proyecto el cual es "AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE CARGA EN EL SECTOR LLANO LINDO DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE, medido con el indicador "SUBESTACION 34.5/13.8 KV 10 MVA CONSTRUIDA", la interventoría recomienda la terminación del proyecto, a la menor brevedad posible, con el fin de lograr la puesta en servicio la subestación Llano Lindo.</p> <p>Dado que es pertinente realizar ajustes en el proyecto, ENERCA consolido la información presentada en el balance final presentado dentro del contrato de Interventoría, en donde se evidencia con soporte en memorias de cálculo, ítem por ítem, todo lo ejecutado y lo programado por ejecutar, para lograr culminar la meta del proyecto, y conforme a los resultados del balance de cada una de las actividades ejecutadas hasta la fecha, se motivó técnicamente la solicitud del ajuste en valor adicional y en plazo, para realizar un nuevo contrato de obra, Interventoría, y apoyo a la supervisión. Para ello, ENERCA realizó y valido mediante estudio de mercado, el valor presente de las actividades contractuales que no realizó el contratista, y de los ítems no previstos que se requieren para cumplir con todos los requisitos de energización de la subestación Llano Lindo, resaltando que los "Ítems no previstos, se dejaron identificados en el informe final de Interventoría.</p> <p>Que se mantienen las mismas especificaciones técnicas del diseño inicial.</p> <p>En el Anexo se entrega informe realizado por la Gerencia de Distribución de ENERCA, donde se analiza, y resume la información entregada en el final de interventoría, memoria de cantidades, y acta de liquidación como documentos que avalan las cantidades pendientes por ejecutar, indicando los ítems no previstos, que por consideración del contratista de obra, con aval de Interventoría, y del grupo supervisor, (conformado por FERNANDO PARRA CELY, Gerente de Distribución, WILFREDO GARZON MARTINEZ, Director de Operación y mantenimiento de Subestaciones, CLAUDIA PATRICA FLOREZ, Asesor sistemas de Información, NORBERTO CACERES NIÑO, Director Calidad del Servicio, y ANDRES LARA RODRIGUEZ, Asesor de Planeación y Regulación), son necesarios para poner en funcionamiento la Subestación Llano lindo, y así cumplir con el objetivo del proyecto. Las cantidades a ejecutar son sustentadas con memorias en un nuevo formato de ENERCA, así mismo, se entregan las memorias de ejecución firmadas por la Interventoría Adicionalmente se realizó el ajuste del presupuesto según estudio de mercado, ya que el proyecto se inició en el año 2018 y los costos a la fecha han presentado un incremento considerable.</p> <p>Para dar cumplimiento a la ejecución del proyecto, se solicita adicionar en valor y en</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	



	tiempo por catorce (14) meses, tiempo necesario para la contratación de la obra, interventoría y apoyo a la supervisión, ejecución de contratos y para su liquidación.
--	--

Cuando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 8.209.165.927,00	\$ 2.778.394.689,00	\$ 10.987.560.616,00
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 8.209.165.927,00	\$ 2.778.394.689,00	\$ 10.987.560.616,00

Proyecto No 4

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2021005850029
Valor total del proyecto	\$ 8.297.011.485,00
Causal de ajuste	<p>De acuerdo a la información reportada por la entidad designada para la ejecución del proyecto se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.12.1 del acuerdo único de la comisión rectora para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación del valor total del proyecto.</p> <p>La Gobernación de Casanare actualizo los precios de referencia para la contratación de obra pública, mediante la emisión de la Resolución de Precios No 0172 con fecha 28 de agosto del 2023 Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para la contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare" El presupuesto del proyecto en mención se realizó con base en la resolución No 077 del 20 de abril del 2022, generando una variación de los precios unitarios contemplados, y por tanto en el valor total del proyecto.</p> <p>El valor inicial de SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS M/CTE. (\$7.889.748.172), al aplicar los nuevos valores unitarios APU's, paso a un valor de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$ 8.297.011.485), con una variación de CUATROCIENTOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS M/CTE. (\$ 407 263.313). equivalente a un incremento del 5,16% del valor total inicial del proyecto.</p> <p>Una vez analizado el componente técnico, se establece que Las condiciones técnicas aprobadas en la viabilidad del proyecto, emitida el 23 de agosto del 2023, se Mantienen</p> <p>Sin embargo, se debe recalcar que, para asegurar el alcance del proyecto, el cual está definido por el objetivo General, con su indicador de resultado, los objetivos específicos y los productos con la Calidad Técnica planteada y aprobada en el proyecto, es indispensable asegurar que se contemplen todos costos a precio actual, ya que el componente financiero soporta la obtención de los productos aprobados. La asignación eficaz de recursos asegura el logro de los objetivos en los plazos y calidad establecidos y aprobados.</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Cuando sea de valores o fuente de financiación:



AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 7.889.748.172,00	\$ 407.263.313,00	\$ 8.297.011.485,00
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos			\$ -
Otras fuentes			\$ -
TOTAL	\$ 7.889.748.172,00	\$ 407.263.313,00	\$ 8.297.011.485,00

Proyecto No 5

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2023005850019
Valor total del proyecto	\$ 4.581.553.660,00
Causal de ajuste	<p>De acuerdo a la información reportada por la entidad designada para la ejecución del proyecto se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.1.2.1 del acuerdo único de la comisión rectora, para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación del valor total del proyecto.</p> <p>La Gobernación de Casanare actualizo los precios de referencia para la contratación de obra pública, mediante la emisión de la Resolución de Precios No 0172 con fecha 28 de agosto del 2023 Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para la contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare El presupuesto del proyecto en mención se realizó con base en la resolución No 077 del 20 de abril del 2022, generando una variación de los precios unitarios contemplados, y por tanto en el valor total del proyecto.</p> <p>El valor inicial de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTE TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS M/C \$4.223.072.617,00, al aplicar los nuevos valores unitarios APUS, paso a un valor de CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE (\$4.581.553.660,00), con una variación de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUARENTA Y TRES PESOS MCTE. (\$358.481.043,00), equivalente a un incremento del 8,49 % del valor total inicial del proyecto: Una vez analizado el componente técnico, se establece que las condiciones técnicas aprobadas en la viabilidad del proyecto, emitida el 23 de octubre del 2023, se Mantienen.</p> <p>Sin embargo, se debe recalcar que, para asegurar el alcance del proyecto, el cual está definido por el objetivo General, con su indicador de resultado, los objetivos específicos y los productos. con la Calidad Técnica planteada y aprobada en el proyecto, es indispensable asegurar que se contemplen todos costos a precio actual, ya que el componente financiero soporta la obtención de los productos aprobados. La asignación eficaz de recursos asegura el logro de los objetivos. en los plazos y calidad establecidos y aprobados</p>

Cuando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 4.223.072.617,00	\$ 358.481.043,00	\$ 4.581.553.660,00

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	



Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos			\$ -
Otras fuentes			\$ -
TOTAL	\$ 4.223.072.617,00	\$ 358.481.043,00	\$ 4.581.553.660,00

Proyecto No 6

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN EL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE DEL MUNICIPIO DE PORE DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2023005850019
Valor total del proyecto	\$ 4.581.553.660,00
Causal de ajuste	<p>De acuerdo a la información reportada por la entidad designada para la ejecución del proyecto se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.1.2.1 del acuerdo único de la comisión rectora, para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación de cambio de ejecutor del proyecto, Una vez analizado el componente técnico, se establece que las condiciones técnicas aprobadas en la viabilidad del proyecto, emitida el 8 de Noviembre del 2023, se Mantienen, Una vez analizado el componente jurídico, se establece que las condiciones técnicas aprobadas en la viabilidad del proyecto, emitida el 8 de Noviembre del 2023, se Mantienen, Una vez analizado el componente ambiental, se establece que las condiciones técnicas aprobadas en la viabilidad del proyecto, emitida el 8 de Noviembre del 2023, se Mantienen.</p> <p>Sin embargo, se debe recalcar que, para asegurar el alcance del proyecto, el cual está definido por el objetivo General, con su indicador de resultado, los objetivos específicos y los productos, con la Calidad Técnica planteada y aprobada en el proyecto, es indispensable asegurar que se contemplen todos costos a precio actual, ya que el componente financiero soporta la obtención de los productos aprobados. La asignación eficaz de recursos asegura el logro de los objetivos, en los plazos y calidad establecidos y aprobados</p>

Proyecto No 7

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO A LA VEREDA TURUA - MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Código BPIN	2017005850047
Valor total del proyecto	\$ 2.829.059.180,86
Causal de ajuste	<p>De acuerdo a la información reportada por la entidad designada para la ejecución del proyecto se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.1.2.1 del acuerdo único de la comisión rectora, para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación del valor total del proyecto.</p> <p>La Gobernación de Casanare actualizo los precios de referencia para la contratación de obra pública, mediante la emisión de la Resolución de Precios No 0172 con fecha 28 de agosto del 2023 Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para la contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare. El presupuesto del proyecto en mención se realizó con base en la resolución No 077 del 20 de abril del 2022, generando una variación de los precios unitarios contemplados, y por tanto en el valor total del proyecto.</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casánare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Cuando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 2.619.705.505,75	\$ 0,00	\$ 2.619.705.505,75
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ 209.353.675,11	\$ 209.353.675,11
TOTAL	\$ 2.619.705.505,75	\$ 209.353.675,11	\$ 2.829.059.180,86

Proyecto No 8



ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS MAGAVITA ALTA MAGAVITA BAJA SAN JOSE Y LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE RECETOR DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2022005850011
Valor total del proyecto	\$ 4.219.663.262,00
Causal de ajuste	La información reportada por la entidad designada para la ejecución del proyecto se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.1.2.1 del acuerdo único de la comisión rectora, para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación de costos de las actividades existentes que modifican el valor total del proyecto y la inclusión de una nueva fuente de financiación. Así mismo justifica técnicamente el ajuste considerando que, después de realizado el replanteo se evidencio que se requiere construir pasos elevados menores a 12m de longitud, donde no es aplicable la construcción del tipo de pasos elevados contemplados en el proyecto, las actividades de excavación para la instalación de tuberías permitió identificar la presencia de rocas de sobre tamaño que se encuentra constantemente en la línea de excavación las cuales deben ser demolidas de manera parcial o total, actividad que se desarrolla con herramienta menor pero que disminuye el rendimiento por cual resulta necesario realizar excavación manual en roca, además, que las zonas específicas a intervenir con la instalación de tubería y construcción de estructuras de paso es de difícil acceso, por ende, los materiales para todas las actividades deben ser transportados a lomo de mula, actividad que económicamente resulta representativa y no se contempló en el proyecto.

Cuando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 3.054.537.060,00	\$ 0,00	\$ 3.054.537.060,00
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ 1.165.126.202,00	\$ 1.165.126.202,00
TOTAL	\$ 3.054.537.060,00	\$ 1.165.126.202,00	\$ 4.219.663.262,00

Proyecto No 9

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL SENA SEDE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2021005850080
Valor total del proyecto	\$ 27.665.933.211,31
Causal de ajuste	Se requiere realizar mejoras técnicas al sistema de aire acondicionado y ventilación del auditorio y de voz y datos del contrato de obra No 2266 de 2021-12-27 cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO AGROINDUSTRIAL Y FORTALECIMIENTO

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casánare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	<p>EMPRESARIAL SENA SEDE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE de acuerdo a la necesidad de entregar una infraestructura educativa funcional según los requerimientos técnicos establecidos en la normatividad vigente aplicable garantizando salvaguardar el proyecto, los intereses superiores del Estado y cumplimiento del alcance contractual. El ajuste relaciona las actividades de red de voz y datos excluye instalaciones eléctricas, CCTV, Sonido IP, Domótica y Controles de Acceso, el diseño garantiza la protección de la red contra todos los riesgos eléctricos en los cuartos de comunicaciones con una instalación regulada para la red de voz y datos de acuerdo a lo establecido en la norma RETIE y la NTC 2025. El componente aire acondicionado y ventilación de auditorio en su ajuste garantiza una climatización térmica adecuada de acuerdo a las condiciones de operación exterior e interior del auditorio y un sistema de extracción mecánica accionada por detectores de movimiento en cada una de las baterías de baño que proporcionan a los usuarios un uso confortable y agradable del espacio El ajuste al diseño cumple con las normativas que avalan la aplicación de cantidades mínimas de ventilación, calidad del aire que minimiza efectos adversos para la salud, consumos de energía eficientes, cálculos de cargas, distribución de aire, diseños de tubería y aplicación de tuberías de aire acondicionado.</p>
--	---

Quando sea de valores o fuente de financiación:



AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 24.958.221.316,00	\$ 2.707.711.895,31	\$ 27.665.933.211,31
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 24.958.221.316,00	\$ 2.707.711.895,31	\$ 27.665.933.211,31

Proyecto No 10

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN RED EN DOBLE CIRCUITO 34,5/13,8 KV AGUAZUL - MANI CASANARE
Código BPIN	2013005850069
Valor total del proyecto	\$ 15.328.582.205,60
Causal de ajuste	<p>Técnicamente en el estudio presentado por la interventoría en donde se establece la necesidad de realizar obras adicionales toda vez que se hace necesario la ejecución de obras complementarias, que garanticen la energización y entrada en operación de la red doble circuito 34.5/13.2 Kv. Teniendo en cuenta que deben ejecutar obras complementarias, adecuaciones y construcción de nuevos tramos de red de media. tensión a nivel de 13.2 KV para poder garantizar el servicio de energía, se aumenta la actividad de topografía realizada y se requiere hacer levantamientos de las redes existentes para incluirlas en el trazado actual Es necesario que las redes proyectadas se instalen sobre apoyos para esta, y por ende los apoyos y templetes requeridos para las nuevas redes deben ser enterrados para que cumplan su propósito, cumpliendo con la especificación técnica. Igualmente, para el buen funcionamiento en el sector de la antigua subestación Piñalito en la vereda Piñalito, del municipio de Aguazul se requiere construir un tramo de red de media tensión a nivel de 34.5 kv, para cumplimiento de distancias mínimas de seguridad, se requiere que dicho trazado sea realizado en red compacta, por lo tanto, en el tramo de red proyectado se debe instalar la cantidad 39 m de cable XLPE en 266.8 MCM, este cable es soportado por la misma cantidad en cable de guarda.</p>

Quando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 14.529.253.695,60	\$ 0,00	\$ 14.529.253.695,60

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casanare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ 799.328.510,00	\$ 799.328.510,00
TOTAL	\$ 14.529.253.695,60	\$ 799.328.510,00	\$ 15.328.582.205,60

Proyecto No 11



ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2021005850074
Valor total del proyecto	\$ 20.594.200.382,00
Causal de ajuste	Que el proyecto en mención contempla los componentes de obra, interventoría y supervisión, para el desarrollo del mismo cuyo objeto es MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DEL PR 2+900 AL PR 10+900 DEL ANILLO VIAL CUPIAGUA CUSIANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE, se contempla la construcción de un muro geoarmado en el k3+240 para la estabilización de la vía, construcción de muros en gavión para contención de taludes, obras de drenaje, filtros y cunetas, terminación de la estructura de pavimento flexible del k 8+300 al k 10+900, adicionando subbase, base, imprimación y mezcla asfáltica.

Cuando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 16.901.675.615,00	\$ 0,00	\$ 16.901.675.615,00
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ 3.692.524.767,00	\$ 3.692.524.767,00
TOTAL	\$ 16.901.675.615,00	\$ 3.692.524.767,00	\$ 20.594.200.382,00

Proyecto No 12

ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	ADECUACIÓN TERMINACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL MEGACOLEGIO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2021005850021
Valor total del proyecto	\$ 16.612.060.232,00
Causal de ajuste	<p>De acuerdo a la información reportada por la interventoría y supervisión del proyecto es necesario garantizar un equilibrio económico del contrato de Obra Pública No 1965-de 22-10-2021, que actualmente se encuentra en ejecución, dicho ajuste en valor y plazo de ejecución, dado que se requirieron ítems no previstos adicionales de vital importancia para garantizar el funcionamiento hidráulico, aguas lluvias, el proyecto en general y dar cumplimiento a la meta del proyecto. Se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es la necesidad de realizar la modificación de las variables definidas a través del artículo 4.5.1.2.1 del acuerdo único de la comisión rectora, para los ajustes a los proyectos de inversión aprobados que versen sobre modificación del valor total del proyecto.</p> <p>La Gobernación de Casanare actualizo los precios de referencia para la contratación de obra pública, mediante la emisión de la Resolución de Precios No 0172 con fecha 28 de agosto del 2023 "Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para la contratación de obra pública en la Gobernación de Casanare" Por tanto las actividades contempladas en el adicional cumplen con la resolución de precios actual como</p>

 Sistema General de Regalías	DEPARTAMENTO DE CASANARE	 Casánare Versión: 8 15/11/2019
	Rendición de Cuentas	

	se aprecia en la certificación de precios emitida el 19 de diciembre de 2023.
--	---

Quando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 16.031.140.032,00	\$ 580.920.200,00	\$ 16.612.060.232,00
Asignación de Inversión Regional 60% - Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 16.031.140.032,00	\$ 580.920.200,00	\$ 16.612.060.232,00

Proyecto No 13


ITEM	Descripción
Nombre del proyecto	CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL CENTRO POBLADO LA YOPALOSA EN EL MUNICIPIO DE NUNCHÍA DEPARTAMENTO DE CASANARE
Código BPIN	2021005850091
Valor total del proyecto	\$ 21.049.923.604,16
Causal de ajuste	<p>De acuerdo a la información reportada por el ejecutor y por la interventoría contratada se aprecia que la razón principal que da motivo a la presente solicitud de ajuste es la necesidad del mejoramiento de la subrasante del susko que servirá de soporte para la construcción de la obra complementaria, como lo es el pavimento rígido. Al respecto reporta el ejecutor en su misiva, que se realizó una caracterización geotécnica del material y capacidad de soporte del mismo, con el fin de verificar y garantizar la estabilidad de la estructura de pavimento a entregar</p> <p>De este ejercicio se genera un concepto técnico el cual da como resultado que el suelo de fundación o subrasante es un suelo arcilloso de baja a media plasticidad, que teniendo en cuenta el cálculo de la humedad de equilibrio se establece que es un suelo potencialmente expansivo y este potencial de expansión puede generar problemas de hundimientos o fallos en la estructura, puesto que la humedad de equilibrio es mayor a la humedad natural, confirmando que se podrían presentar problemas o cambios volumétricos por oscilaciones del nivel freático, aguas lluvias, de escorrentia e infiltración. Al hacer la evaluación de la capacidad de soporte se observa que por los valores de CBR el suelo ofrece condiciones de media a baja resistencia y a partir de los resultados del CBR de diseño se establece que la categoría de la subrasante es S1, con valores de $CBR \leq 3\%$ lo cual indica un comportamiento como suelo de fundación MALO.</p> <p>Por lo anteriormente descrito se constituye la necesidad de realizar un mejoramiento del suelo de subrasante, ya que su capacidad de soporte es mala al ser un suelo blando, plástico y potencialmente expansivo. La recomendación dada es la instalación de un mejoramiento con crudo de río de mínimo 0.50m de espesor compactado, como soporte de la estructura de pavimento definida en diseño inicial.</p> <p>De igual forma en la ejecución propia del contrato de obra, se aprecia la generación de un balance de mayores y menores cantidades que conllevan a un aumento de valor, dichos capítulos principales que presentan dicho requerimiento en balance son:</p> <p>CAPITULO 1. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CAPITULO 2. CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL CAPITULO 3. CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO. CAPITULO 4. OBRAS COMPLEMENTARIAS.</p>

Rendición de Cuentas


Cuando sea de valores o fuente de financiación:

AJUSTES	Valor Inicial aprobado	Valor ajustado solicitado	Valor final
Asignaciones directas 20%	\$ 20.121.391.372,00	\$ 928.532.232,16	\$ 21.049.923.604,16
Asignación de Inversión Regional 60% Departamentos	\$ -	\$ -	\$ -
Otras fuentes	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 20.121.391.372,00	\$ 928.532.232,16	\$ 21.049.923.604,16

Para Constancia se firma el presente informe a los 25 días del mes de enero de 2024



ALFONSO CARDENAS SILVA
Director Departamento Administrativo de Planeación

Proyectó: 
Jairo Enrique Bacca Roa
Profesional Especializado DAP
